

令和5年度北条道路由良川橋第2下部工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿 地内
工期	令和5年5月30日 ～令和6年10月31日
現場代理人	山本 勇己
監理技術者	嶋田 政裕
本工事は、東伯郡北栄町由良宿 由良川橋のA1橋台（東側）と、ボックスカルバートを施工する工事です。	


工事数量

橋台工	
A1橋台	1式
場所打杭工	
φ1500mm	N=6本
地盤改良工	
サンドコンパクション	N=605本
場所打函渠工	
1号場所打函渠	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年6月末)	54.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。6月末現在、A1橋台はコンクリート打設・鉄筋組立・型枠設置・作業箇所の足場設置を行っています。7月は引き続き橋台の縦壁コンクリート打設。1号函渠の仮設工等を行い本工事に着手します。地盤改良工(サンドコンパクション)は引き続き施工を行います。地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、生コン車トラックの通行や工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

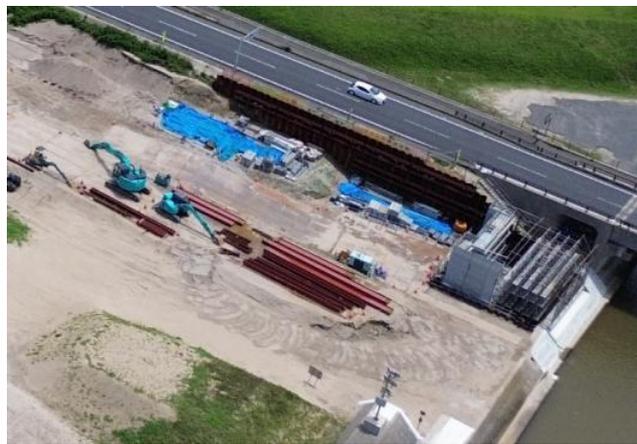

施工状況（A1橋台）



施工状況（1号現場打函渠）
