

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和7年12月26日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。	

工事数量

- 道路土工 - 掘削工 $V=144\text{m}^3$ - 路体盛土工 $V=779\text{m}^3$ - 法面整形工 $A=263\text{m}^2$ - 地盤改良工 - 締固め改良工 $\text{サト}^\circ \text{コハ}^\circ \text{クヨハ}^\circ \text{ル}$ 1,168本 - 固結工 薬液注入 5本 - 仮設工 1式	
工事進捗率 (令和7年5月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年5月度は、路肩規制を行い仮設工の仮囲い撤去を施工しました。

北条道路は、交通量が多く、車両の走行速度も速く危険が伴う、作業でしたが安全に作業を行えるよう、工事看板・保安施設の設置、作業員・誘導員への教育・指導の徹底で無事故・無災害で仮囲い撤去を施工できました。


令和7年6月度は、仮設工の工事用道路（敷砂利）を行います。

碎石搬入のため、ダンプの出入りが予定されています。安全な運転を教育・指導し交通災害防止を図り、6月も無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

西側の仮囲い撤去前

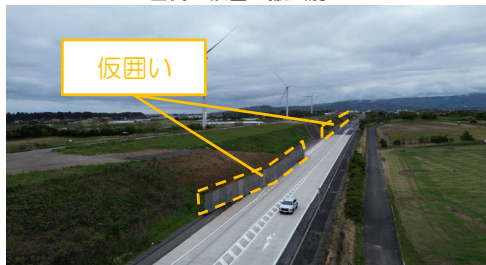

西側の仮囲い撤去完了



東側の仮囲い撤去前



東側の仮囲い撤去完了



令和7年5月末
