

令和5年度 北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年7月31日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の両岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。	


工事数量

• 道路土工	
路体盛土工	V=3,800m ³
• 橋台工（A1橋台）	
場所打杭工 （φ1,200mm、L=35.0m）	N=12本
橋台躯体工	1式
• 橋台工（A2橋台）	
場所打杭工 （φ1,500mm、L=31.0m）	N=9本
橋台躯体工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 （令和6年2月末）	74.0%

コメント

こんにちは、監理技術者の岡本です。
暦の上での立春を過ぎたとはいえ、厳しい寒さ・天候が断続的に続いて、私をはじめ現場関係者皆で、体調を崩さないようにと注意喚起をしている今日この頃です。
現在の現場進捗状況の説明をします。まず、湯梨浜工区 A1側は埋戻しと鋼矢板引抜きが完了して、仮設足場のステップ2を行っているところです。あと2回、ポンプ車でコンクリート打設を行います。次に、北栄工区 A2側は、最終のコンクリートを打設しました。（※コンクリート打設時の写真添付）この後は、コンクリート養生後に型枠解体と仮設足場を撤去したらよいよ橋台の完成となります。
A2側においては、橋台施工の完了後に地盤改良工・擁壁工と次の施工を進めていく予定です。引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真

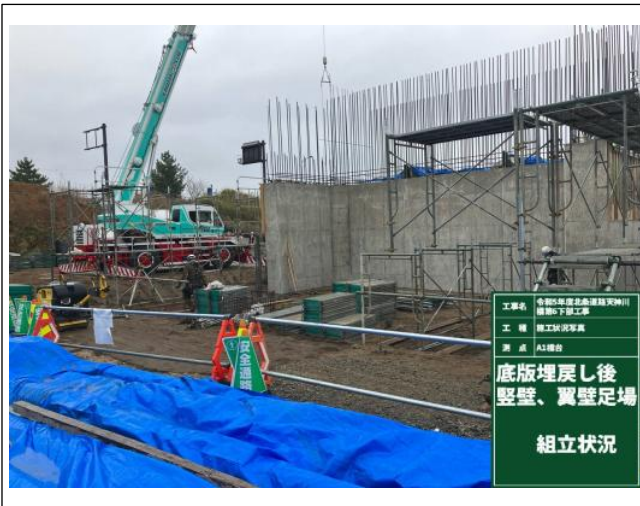

2月末現場状況（湯梨浜工区 A1側）



2月末現場状況（北栄工区 A2側）
