

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。	

工事数量

- 地盤改良工 - 締固め改良工 サンドコンパクション 11 - 固結工 薬液注入 5本 - 仮設工 1式	
工事進捗率 (令和7年7月末)	29.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年8月度は南側で作業構台の組立、北側はサンドコンパクションSAVE-HA工法による改良が完了し、工事用道路の切替準備を行いました。
HA施工機械の周りでは、タイヤショベル・バックホウ等による作業が行われましたが、作業範囲の確認・周知等、日々の安全管理により8月も無事故・無災害で施工ができました。

令和7年9月度は、引続き南側で作業構台の組立を行い、完了後SAVE-SP工法による改良と旧工事用道路の上でSAVE-HA工法による改良を同時に施工します。

引続き無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。


地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年7月末



令和7年8月末

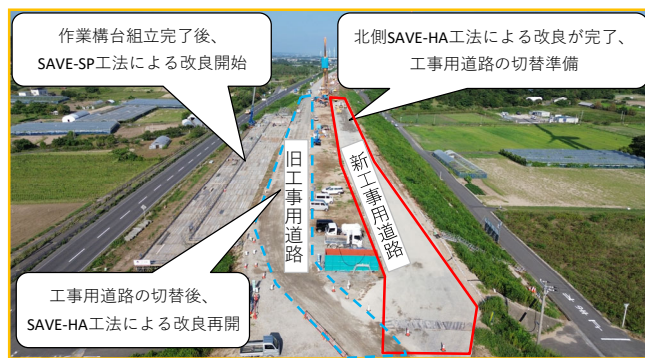

令和7年8月末
