

令和6年度
北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
<p>本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 地盤改良工 締固め改良工 固結工 仮設工 	サト`コハ°クヨハ°ル 1,168本 薬液注入 5本 1式
工事進捗率 (令和7年12月末)	91.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年12月は、足場解体・工事用道路施工準備を行いました。

令和8年1月は、工事用道路施工のため、除草作業後に3次元測量を行います。その後、既設構造物取壊し、集水桝・側溝据付等を順次施工します。

引き続き北条バイパス沿いでの作業となりますので、飛散防止対策・土砂流出防止等を徹底し、無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。


地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年12月末



令和8年1月 施工予定

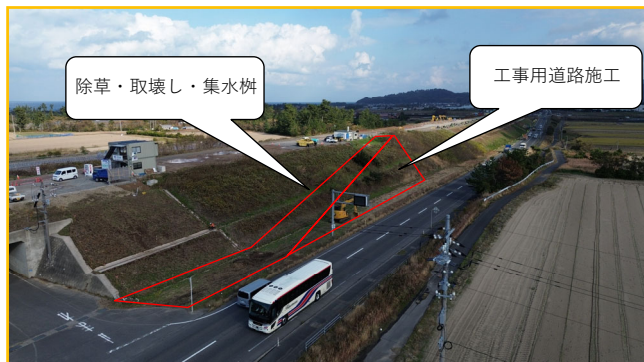

令和7年12月末
