

令和6年度 北条道路江北地区第8地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年1月30日
現場代理人	藤井 萌々子
監理技術者	下山 博
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、路体盛土工・地盤改良工・排水構造物工を施工する工事です。R9号側の地盤改良工が主です。	

工事数量

・道路土工	
路体盛土工(ICT)	V=300m ³
・地盤改良工	
自走式土質改良工	V=300m ³
締固め改良工	サンドコンパクションパイル N=341本
固結工	薬液注入 N=195本
・排水構造物工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年7月末)	6.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。


7月の進捗は、国道9号沿いの足場組立を施工しました。

今後の予定としまして、8月いっぱい足場組立を行い、並行して地盤改良工事をお盆休暇明けより施工していきます。

国道9号側の路肩付近に足場があるので通行には、ご注意ください。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

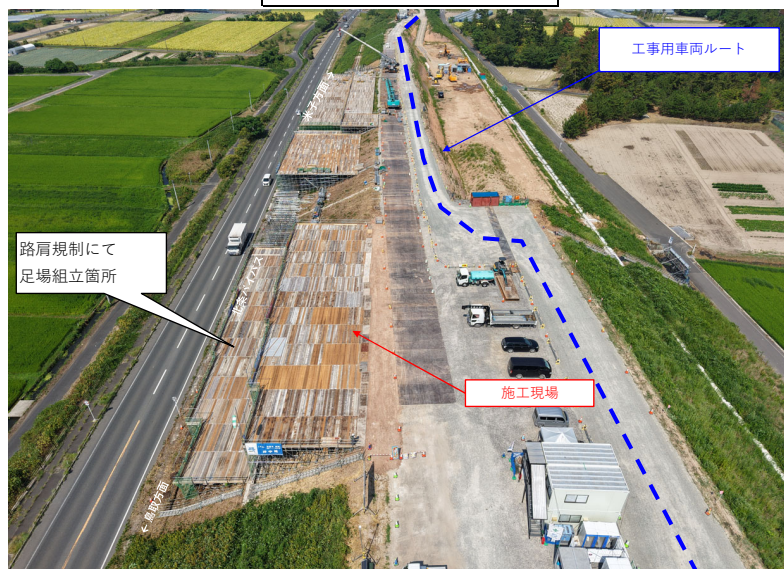

令和7年7月末
