

令和4年度北条道路天神川橋第4下部工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～東伯郡北栄町江北地内
工期	令和4年11月15日～令和6年2月29日
現場代理人	渡邊 巧
監理技術者	秋草 毅
<p>本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5Kmの自動車専用道路北条道路の内、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先～東伯郡北栄町江北地先における天神川橋（P3橋脚）を築造する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 道路土工 残土処理工 RC橋脚工 床堀 埋戻し 既製杭工 橋脚躯体工 仮設工 	<ul style="list-style-type: none"> V=550m³ V=1,000m³ V=2,100m³ N=15本 P3橋脚 1基 1期施工 1式 2期施工 1式
工事進捗率 (令和5年12月末)	93.0%

コメント

本工事は河川区域内にあり、出水期（6月10日～10月20日）の作業中断を経て11月1日より2期工事の足場設置を行いました。現在は柱部の打設が完了し、梁部の鉄筋組立施工中です。今後の工程は1月11日に梁部のコンクリート打設、1月15日に台座コンクリート打設を行い生コン打設は完了します。高所での作業が毎日続きますが安全第一を念頭に完成に向けて頑張ります。工事関係車両の往来により地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様にはご迷惑をお掛けしますが、工事車両の安全走行徹底して工事を進めて参ります。引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。



進捗状況写真


P3橋脚（足場外部シート養生）



A2側～P2側を望む 全景

P3橋脚（梁部 鉄筋組立）

R5.12月27日撮影

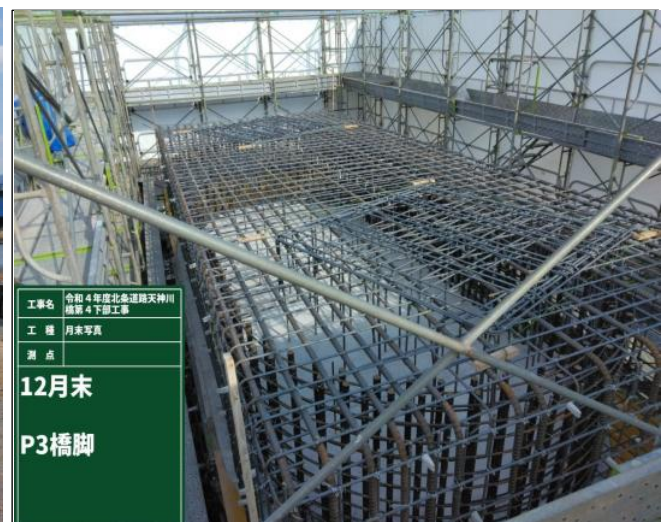

梁部 鉄筋組立(左側～右側)
