

令和4年度北条JCTランプ橋第2鋼上部工事

工事概要

施工者	株式会社 IHIインフラシステム
工事場所	東伯郡北条町弓原地内
工期	令和4年11月16日 ～令和7年2月28日
現場代理人	梶岡 道生
監理技術者	三宅 隆之
<p>本工事は、東伯郡北条町弓原地内にて、北条JCT橋AB1～P1（3径間）の鋼上部を施工する工事です。</p>	

工事数量

鋼3径間連続合成箱桁橋	
橋長	178m
支間長	61.0m+68.0+47.25m
総幅員	6.14m+7.29m
鋼重	385 t
・支承工	ゴム支承 8基
・床版工	1,149m ²
	コンクリート 346m ³
・壁高欄工	コンクリート 112m ³
工事進捗率 (令和7年2月末)	100.0%

コメント


平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

本工事におきまして、12月は壁高欄の型枠解体と橋面裏の排水管設置を行ないました。1月は国道上の足場解体を行ないました。2月は下部工排水の設置と塗装タッチアップ、管繕設備等の搬出を行ないました。

令和6年4月15日に現場着手し、令和7年2月28日をもって本工事が完了しました。

山陰特有の気候のなか思うように進捗しない時期もありましたが、夜間の通行止め規制等を経て無事完工することができました。ご協力頂きましたご地域の皆様方、誠にありがとうございました。北条道路の事業はまだまだ続きますので、今後ともよろしくお願い致します。

進捗状況写真

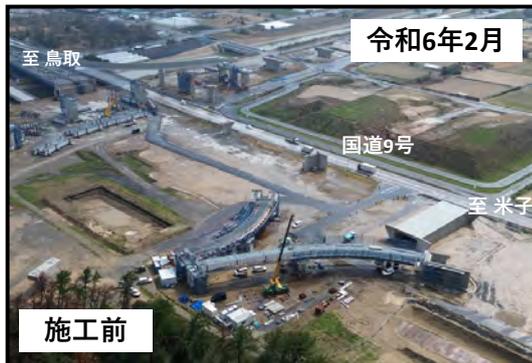

令和7年2月末 (弓原地内)
