

# 令和5年度北条道路東園橋下部工事

## 工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北条町東園地内
工期	令和5年9月1日 ～令和6年9月30日
現場代理人	石賀 巨
監理技術者	正木 洋一
本工事は、東伯郡北条町東園地内において、町道東園日本隠線にかかる東園橋のA1・A2橋台を主として施工する工事です。	

## 工事数量

• 道路土工	
残土処理工	V=1,240m <sup>3</sup>
• 橋台工 (A1橋台)	
場所打杭工 (φ1,200、L=44.0m)	N=9本
橋台躯体工	1式
• 橋台工 (A2橋台)	
場所打杭工 (φ1,200、L=44.5m)	N=8本
橋台躯体工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年9月)	100.0%

## コメント


平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

9月は、町道東園日本隠線の舗装・区画線を施工し、令和6年9月26日に工事完成検査を受け、工事を完了することができました。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けしました。

工事完成まで、ご協力頂きまして誠にありがとうございました。

## 進捗状況写真

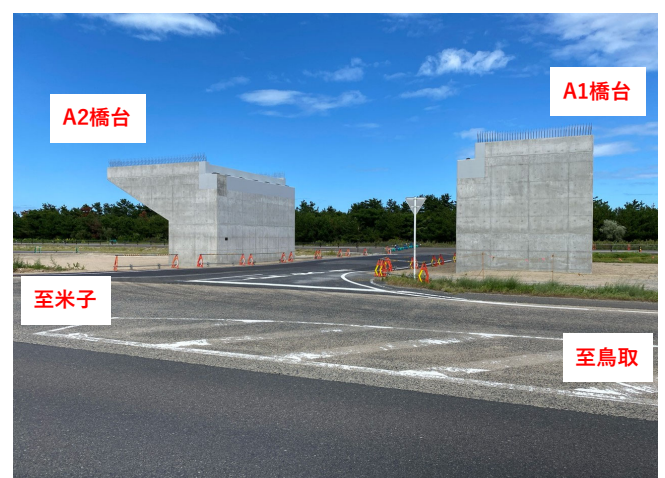

9月完成
